


# 中央区天神5丁目地内配水管布設工事（工事概要）

## 1 工事目的

本工事は、中央区天神5丁目地内の都市計画道路千鳥橋唐人町線那の津大橋架替に伴う配水管整備を行った工事である。

## 2 工事内容

- ①工事件名：中央区天神5丁目地内配水管布設工事
- ②工 期：令和5年9月26日～令和6年12月8日
- ③契約金額：¥349,050,900
- ④工事内容
  - 推進工：さや管φ900 ヒューム管 L=126.3m
  - 挿入管：φ700 PN形ダクタイトイル鑄鉄管L=128.9m
  - 開削工：φ300 GX形ダクタイトイル鑄鉄管L= 15.7m
- ⑤発 注 者：福岡市水道局配水部中部管整備課
- ⑥受 注 者：福東株式会社 代表取締役 兼安 又次郎
- ⑦特に顕著な事柄
  - 1. 土質調査及び裏込め注入材を行い、高品質な立坑築造に努めた。
  - 2. ケーシング上部に雨水流入防止のための土留鉄板を設置した。
  - 3. 河川への汚濁の流出防止を行った。
  - 4. 施工ヤード外周に仮囲いを設置した。また、福岡ウォールアートプロジェクトに協力し、仮囲いにアート作品を掲出した。

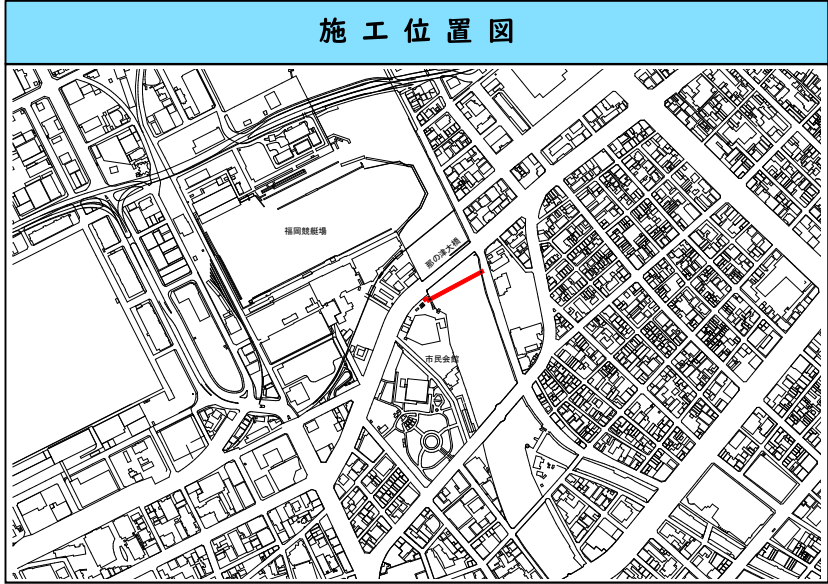

## 3 工事写真



## 4 特に顕著な事柄

